

Comité de Monitoreo Estratégico

Visita de Campo 03-2021 Virtual Unidades Móviles



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO DE LA VISITA.....	4
EQUIPO CONFORMADO PARA LA VISITA.....	4
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA	5
Presentación de datos SSR MTS- Asociación Orquídeas del Mar	5
Estado actual de la subvención.....	5
Avances de Enero a Abril 2021	6
Departamentos y municipios en donde han trabajado	6
Logros alcanzados en el periodo de ejecución.....	6
Limitantes Identificadas.....	7
Acciones ante la situación.....	7
Recomendaciones para mejora en la implementación	7
Evidencia fotográfica de acciones realizadas en el período	8
Sección de preguntas.....	8
Presentación de datos SSR HSH- Asociación Entreamigos	9
Estatus implementación año 2021	9
Reporte HSH alcanzados con paquete de prevención VIH primer trimestre	9
Consolidado de HSH alcanzados con paquete prevención VIH en relación con la meta	9
Limitantes.....	10
Desafíos y cuellos de botella de actividades de prevención de las UM y de los SSR.	10
Impacto COVID19 en la organización para el desarrollo de las actividades	10
Recomendaciones.....	11
Reseña fotográfica.....	11
Sección de preguntas.....	12
Conclusiones	12

INTRODUCCIÓN

A través del financiamiento del Fondo Mundial en El Salvador, se ejecutan actualmente 2 subvenciones: 1 para VIH y una 1 para Tuberculosis; ambas administradas por el Ministerio de Salud (MINSAL). La Subvención para VIH (SLV-H-MINSAL) inició el 01 de enero del 2019 y finaliza el 31 de diciembre del 2021, el cual tiene un monto total aprobado de \$ 14,481,816.00 (Catorce millones, cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos dieciséis dólares americanos).

El MCP-ES como instancia referente del Fondo Mundial debe cumplir una serie de requisitos de elegibilidad para su desempeño. El requisito No. 3 consigna la exigencia de contar con un Plan de Monitoreo Estratégico para garantizar el cumplimiento de las acciones que se enmarcan en la subvención; que conlleva una serie de actividades, entre las cuales se realizan las visitas de campo a aquellas sedes en donde se desarrollen actividades enmarcadas en el proyecto.

Para este año 2021 se han retomado las actividades utilizando ambas metodologías presenciales y virtuales, en esta ocasión la visita se realizó el 27 de abril en modalidad virtual con las organizaciones sub subreceptoras para dar seguimiento a las actividades realizadas con las Unidades Móviles con población MTS y HSH, en el marco de la implementación del proyecto de VIH.

Este documento recoge las apreciaciones y datos obtenidos a través de informes presentados por personal de las organizaciones sub subreceptoras y los comentarios y preguntas realizadas por cada uno de los miembros del comité que participaron en la visita.

Para esta visita, el Comité de Monitoreo Estratégico invitó a participar a los miembros del MCP-ES que conforman el comité de monitoreo, quienes representan diferentes sectores: Sector Gobierno- MINED, MINSAL; Sector ONG's- PASMO, CONAMUS, FUNDASIDA; Sector OBF- Asoc. Cristiana El Renuevo, Personas afectas VIH, TB y Malaria- REDCA+, Grupo de Apoyo Hosp. Zacamil; Poblaciones Clave- Colectiva VENUS, Asoc. COMCAVIS TRANS y del Sector Privado- Grupo Procampoly (AARHES). El detalle de las personas que atendieron la convocatoria puede verse en la página 4 de este informe.

La Coordinación de esta actividad se realizó con el apoyo de la Unidad de Programa VIH/MINSAL, agradeciendo las gestiones realizadas por la Dra. Guadalupe Flores y el sub receptor PLAN, al Lic. Patrice Bauduhin y Dra. Maricela Herrera.

OBJETIVO DE LA VISITA

Presentar Estatus de implementación, desafíos y cuellos de botella de actividades de prevención de las Unidades Móviles, de los SSR de población MTS y HSH durante el año 2021 y el impacto por COVID19.

EQUIPO CONFORMADO PARA LA VISITA

El equipo que participó en la visita de campo estuvo conformado de la siguiente manera:

<i>Nombre</i>	<i>Sector/ Organización</i>
<i>Responsable de la misión</i>	
<i>Lcda. Susan Padilla</i>	ONG's/ PASMO Coordinadora CME
<i>Acompañan la misión</i>	
<i>Lcda. María Mercedes Castillo de Molina</i>	Gobierno/ MINED
<i>Lcda. María Isabel Mendoza</i>	Gobierno/ MINSAL
<i>Sr. Francisco Ortíz</i>	ONG's/ FUNDASIDA
<i>Lcda. Marta Alicia de Magaña</i>	Directora Ejecutiva MCP-ES
<i>Lcda. Karla Eugenia Rivera</i>	Asistente Técnico MCP-ES
<i>Equipo del Receptor Principal</i>	
<i>Dra. Ana Guadalupe Flores</i>	Gobierno/ MINSAL/ Oficina de apoyo FM
<i>Dra. Milisbeth González</i>	Gobierno/ MINSAL/ Oficina de apoyo FM
<i>Lcda. Genny Fuentes</i>	Gobierno/MINSAL/ Unidad Fondos Externos
<i>Lcda. Isabel Mendoza</i>	Gobierno/MINSAL/ Unidad Fondos Externos
<i>Equipo del Sub Receptor</i>	
<i>Lic. Patrice Bauduhin</i>	ONG's / Plan International
<i>Dr. Vinicio Guzmán</i>	ONG's / Plan International
<i>Lic. Edwin Santillana</i>	ONG's / Plan International
<i>Lcda. Xiomara Torres</i>	ONG's / Plan International
<i>Equipo del Sub Subreceptor</i>	
<i>Sra. Consuelo Raymundo</i>	PC- MTS/ Asoc. Orquídeas del Mar
<i>Sra. Christy Roque</i>	PC- MTS/ Asoc. Orquídeas del Mar
<i>Sr. Luis Mario Alemán</i>	PC- MTS/ Asoc. Orquídeas del Mar
<i>Dra. Carmen Figueroa</i>	PC- HSH/ Asoc. Entreamigos
<i>Sr. Joaquín Cáceres</i>	PC- HSH/ Asoc. Entreamigos
<i>Sr. Marvin González</i>	PC- HSH/ Asoc. Entreamigos


DESCRIPCIÓN DE LA VISITA

Esta visita se realizó en modalidad virtual con representantes de las organizaciones sub subreceptoras de las poblaciones HSH y MTS, Asociación Entreamigos y Asociación Orquídeas del Mar, respectivamente. el 27 de abril del 2021 de 9:00 am a 11:00 am; con el objetivo de conocer la implementación, desafíos y cuellos de botella en las actividades de prevención de las Unidades Móviles, de los SSR de estas poblaciones durante el año 2021 y el impacto por COVID19. La responsable de la misión y coordinadora del comité de monitoreo estratégico, Lcda. Susan Padilla, brindó las palabras de bienvenida al equipo que conformó la visita de campo y explicó la metodología bajo la cual se desarrollaría, haciendo saber que en esta oportunidad los representantes de las ONG's SSR presentarían avances de la ejecución.

PRESENTACIÓN DE DATOS SSR MTS– ASOCIACIÓN ORQUÍDEAS DEL MAR

La Sra. Christy Roque, presenta datos del primer trimestre del 2021 y algunas actividades realizadas de las primeras semanas del mes de abril 2021.

Estado actual de la subvención

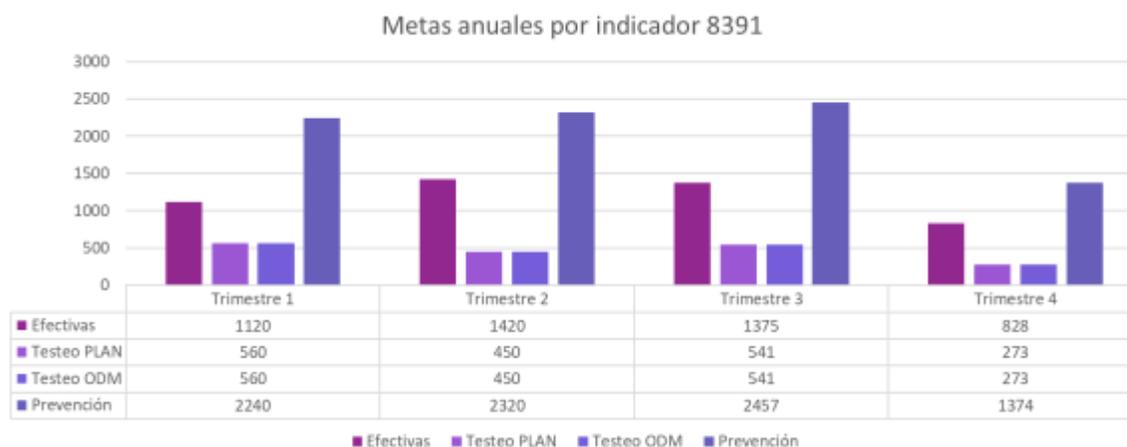

Avances de Enero a Abril 2021



Departamentos y municipios en donde han trabajado

Zonas	Municipios	Departamentos	Municipios
San Salvador	- San Salvador	San Miguel	- San Miguel
	- Soyapango		- El Tránsito
	- Ilopango		- La Unión
	- Aguilares	- Santa Rosa de Lima	
	- San Marcos	- Usulután	
- Tonacatepeque			
Cuscatlán	- San Rafael Cedros	Sonsonate	- Sonsonate
La Libertad	- Puerto de La Libertad	- Acajutla	- San José La Majada
	- San Juan Opico	- Juayúa	- Sonzacate
	- Sitio del Niño		
	- Santa Tecla		
	- Quezaltepeque		
	- San Pablo Tacachico		
	- San Isidro Lempa		
	- San José Villanueva		
		Santa Ana	- Santa Ana
		- Atiquizaya	- Ahuachapán
		- Metapán	

Logros alcanzados en el periodo de ejecución




Limitantes Identificadas

- Pandemia COVID19
- Desembolsos tardíos
- Recargos por pagos extemporáneos
- Presión de parte de proveedores
- Observaciones por pagos extemporáneos
- Reprogramación de actividades
- No contar con disponibilidad de la Unidad Móvil
- Disminución en el número de MTS en las diferentes zonas
- Algunas MTS no portan su DUI
- Falta apoyo de algunas dependencias de las UCSF (Ej. Archivo)

Acciones ante la situación



Recomendaciones para mejora en la implementación

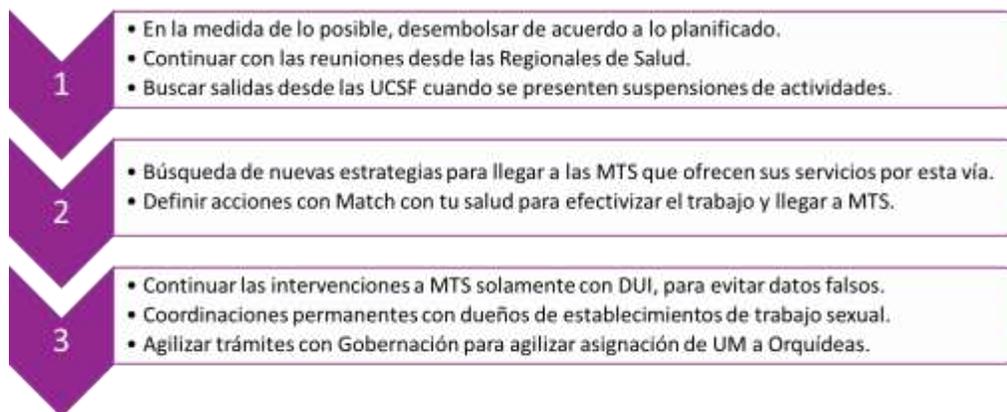

Evidencia fotográfica de acciones realizadas en el período



Foto 1: Trabajo de campo con referencias efectivas y testeo



Foto 2: Intervención de MTS en cervecerías y night clubs



Foto 3: Promoción de actividades



Foto 4: Abordaje en parques

Sección de preguntas

1. ¿Han visualizado la manera de que el personal de la organización pague por las multas? ¿Lo han hablado con el SR? ¿A esta fecha ya han retomado las actividades?

R/ Las multas se presentarán en el próximo informe al SR; con el desembolso recibido hace 2 semanas aproximadamente, ya se solventaron compromisos pendientes como salario, ISSS, AFP y renta. Se ha negociado con los proveedores, nuevas fechas para pago.

2. ¿Cuáles han sido las limitantes con las unidades móviles?

R/ El proceso de traslado de la unidad móvil para Orquídeas aún no se ha concluido, debido que los estatutos se modificaron y la pandemia atraso ese proceso y con las móviles de Plan hay una calendarización y a veces ya están comprometidas con otros actividades.

PRESENTACIÓN DE DATOS SSR HSH- ASOCIACIÓN ENTREAMIGOS

La Dra. Natalia Figueroa, presenta datos del primer trimestre del 2021 y algunas actividades realizadas de las primeras semanas del mes de abril 2021.

Estatus implementación año 2021

Durante el Primer Trimestre de enero a marzo de 2021, logramos obtener resultados favorables a pesar de la limitantes para la ejecución en el abordaje y atención de la población clave de HSH, que corresponde al cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual (POA) programático, de este tercer y último año de ejecución del proyecto, según pruebas rápidas efectivas y capilares del VIH, realizadas en este trimestre, y que se encuentran registradas en el SIGPRO.

Reporte HSH alcanzados con paquete de prevención VIH primer trimestre

PAQUETES DE PREVENCIÓN	PERIODO: ENERO A MARZO 2021											
	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE		
	META	PERSONAS ALCANZADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	META	PERSONAS ALCANZADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	META	PERSONAS ALCANZADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	META	PERSONAS ALCANZADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ALCANZADAS CON PAQUETE BASICO	1,173	1,148	98%	2,245	2,216	99%	1,952	1,910	98%	5,370	5,274	98%
ALCANZADAS CON REFERENCIA EFECTIVA	763	784	103%	1,135	1,235	109%	1,007	823	82%	2,905	2,842	98%
ALCANZADAS CON PRUEBA DE TESTEO	410	364	89%	1,110	981	88%	945	1,087	115%	2,465	2,432	99%

Consolidado de HSH alcanzados con paquete prevención VIH en relación con la meta

PAQUETES DE PREVENCIÓN	PERIODO: ENERO A MARZO 2021		
	META	PERSONAS ALCANZADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ALCANZADAS CON PAQUETE BASICO	5,370	5,274	98%
ALCANZADAS CON REFERENCIA EFECTIVA	2,905	2,842	98%
ALCANZADAS CON PRUEBA DE TESTEO PLAN	740	750	101%
ALCANZADAS CON PRUEBA DE TESTEO ENTRE AMIGOS	1,725	1,682	98%

- o Casos nuevos identificados: 34
- o Casos conocidos: 29

Limitantes

Algunas de las limitantes identificadas son las siguientes:

- Zona de Occidente mayor afectación por suspensión de actividades por falla en logística de traslado de reactivos en la zona.
- Zonas de espacios como parques y plazas no permiten realización de actividades.
- Asocios con otras organizaciones para ejecución de actividades de referencias efectivas.
- Suspensión de actividades por falta de presupuesto. Personal laborando sin pago oportuno de salario.
- Cambio en programación de actividades.

Desafíos y cuellos de botella de actividades de prevención de las UM y de los SSR.

- Ubicación de espacios adecuados para ejecutar jornadas de testeo.
- Cumplimiento de protocolos COVID19 con personal y usuarios de proyecto.
- Falta de reactivos en zonas de trabajo en UCSF.
- Suspensión de actividades por falta de personal de salud asignado.
- Riesgo social del personal en zonas de trabajo.
- Negativa de usuarios para asistir a centros de salud.
- Traslados de personal a los lugares de ejecución de actividades por falta de presupuesto.
- Movilización de los equipos de trabajo del personal de UM cada día trasladando kit de trabajo durante uso de vehículos particulares y UM (cargar y descargar diariamente los implementos de trabajo).
- Movilización de personal de salud hacia jornadas de toma de pruebas COVID19, capacitaciones y traslados que limitan el cumplimiento de actividades.
- Incorporación de nuevo personal.
- Personal pendiente de acreditación en consejería VIH.

Impacto COVID19 en la organización para el desarrollo de las actividades

- Incapacidades médicas del personal.
- Estrés colectivo por miedo al contagio.
- Gasto adicional en EPP.
- Reducción de cumplimiento de metas (año 2020).
- Abordaje de usuarios por temor al contagio.
- Gasto adicional del personal para facilitar uso de EPP de los usuarios.
- Seguimiento oportuno de supervisión de trabajo de los SSR.

Recomendaciones

- Que se logre el abastecimiento de insumos (reactivos) para la toma de pruebas rápidas efectivas del VIH en los diferentes establecimientos de salud, para no detener la ejecución de las actividades.
- Que los establecimientos de salud público mantengan al menos un recurso por especialidad, que dé atención a las poblaciones clave que acercamos los SSR, cuando exista emergencia en la atención de casos por: contagio, pruebas o la vacuna del COVID-19.
- Que se agilice el traspaso de las Unidades Móviles Educativas (UME) a los SSR, según se encuentra establecido en el proyecto, para dinamizar la ejecución de las pruebas de testeo, sin necesidad de utilizar otro tipo de recurso, ya que con ellas se facilita una mejor atención a las poblaciones clave, en un ambiente de confidencialidad, puesto que se encuentran acondicionadas para tal fin.
- Que la transferencia de fondos hacia los SSR se realice de manera oportuna, según se encuentra establecido en el POA financiero, para el desarrollo de las actividades programáticas, puesto que existen compromisos contractuales que generan problemas de incumplimiento.

Reseña fotográfica



Foto 1: Jornada con personal de campo región central



Foto 2: Taller metodológico de trabajo con SSR



Foto 3: Jornada de pruebas de VIH



Foto 4: Post en redes sociales

Sección de preguntas

1. ¿Ya tienen asignadas las Unidades móviles?

R/ No, aún no contamos con las unidades móviles, el proceso ya se encuentra en el último paso que es el trámite de las placas.

2. ¿Los casos nuevos reportados a que período corresponden?

R/ Son del periodo de enero a marzo 2021, del mes de abril se han identificado 7 nuevos casos que serán reportados en el período correspondiente.

CONCLUSIONES

- o Se felicita el equipo, ya que, a pesar de los desafíos y limitantes causadas a raíz de la pandemia, han logrado mantenerse con el desarrollo de las actividades.
- o Se mantendrá informado de la conclusión del proceso de entrega de las unidades móviles a los SSR.
- o La APP Match con tu salud ha sido de gran apoyo para los SSR para hacer contacto con algunos salas de citas no identificadas, es una estrategia interesante.
- o Los reportes deben generarse con calidad ya que tanto SSR como SR y el RP son auditados, esto mejorará los tiempos de desembolso de fondos,



MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, Tuberculosis y Malaria en El Salvador.



www.mcpel salvador.org.sv



<https://www.facebook.com/MCPES2013/>



[@MCPESalvador](https://twitter.com/MCPESalvador)

